

Ciudad de México, miércoles, 06 de junio de 2018

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DEC-DCA-1024316/2018
Asunto: Actualización de acciones


ING. EDGAR OSWALDO TUNGÜI RODRÍGUEZ
COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA
CADA VEZ MAS RESILIENTE
P R E S E N T E

De conformidad con las atribuciones que esa Comisión tiene encomendadas, para llevar a cabo la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, en términos de lo previsto en los artículos 7,8, fracción III y XII; 9, fracciones III, V, VII y X; y 13 de la "LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA VEZ CADA MÁS RESILIENTE", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2017, y atendiendo su solicitud contemplada en el oficio CDMX/CRRTC/303/2018 del 31 de mayo de 2018, le anexo lo siguiente:

Informe pormenorizado de las acciones que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México lleva a cabo, para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente, en atención a los efectos derivados del sismo de 7.1 ocurrido con fecha 19 de septiembre de 2017.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ

CDMX
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FERIA Y EXPOSICIONES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FERIA Y EXPOSICIONES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

07 JUN. 2018

RECIBIDO

FOLIO _____ HORA 12:20

2196

Se recibe oficio con anexos. Montecoral 4/7.

- C.C.P.
- C. Tamara Tania de Alba Vázquez, Directora General de Acuerdos Interinstitucionales, en la CGGI. Presente
- C.P. Frida Palacios García.- Directora General de Administración, SACMEX. Presente.
- Ing. Fernando A. Ávila Luna.- Director Ejecutivo de Construcción, SACMEX.- Presente.
- Ing. Alejandro Martínez Pérez.- Director Ejecutivo de Operación, SACMEX.- Presente.

Archivo*
RAD/FAAL/snl



Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Construcción
Dirección de Construcción A

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

INFORME MENSUAL DE MAYO DE 2018

Reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México,
en una cada vez más resiliente, en atención a los Daños Ocasionados por
el "Sismo de 7.1 ocurrido con fecha 19 de septiembre de 2017

Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Ramón Aguirre Díaz



Contenido

1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de mayo	3
1.1.- Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	3
1.2.- Obras y adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
1.3.- Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
2.- Desglose detallado de las acciones ejecutadas.....	3
2.1.- Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	3
2.2.- Obras y adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
2.3.- Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
3.- Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)..	4

1.- Resumen de las acciones desarrolladas del 19 de mayo al 19 de junio de 2018

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 1	Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	17%	43%	57%
Inversión (\$)	\$236,843,869.78	\$40'689,884.00	\$102'269,290.00	\$134'574,579.78
Avance porcentual (%)		17%	43%	57%

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 2	Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación			
Inversión (\$)	\$113'950,000.00	\$28'487,500.00	\$28'487,500.00	\$85'462,500.00
Avance porcentual (%)	100%	25%	25%	75%

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 3	Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación			
Inversión (\$)	\$193'503,000.00	\$38'700,600.00	\$38'700,600.00	\$154'802,400.00
Avance porcentual (%)	100%	20%	20%	80%

1.1-Indicador Habitantes Beneficiados

2.- Desglose detallado de las acciones ejecutadas

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, con su justificación y observaciones basadas en los indicadores y metas que se establecieron en cada programa.

Ítem	Acción	Estatus (semáforo)	Presupuesto (\$MXN)			Beneficiarios por programa
			Asignado	Ejecutado	Restante / Remanente	
2.1	Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	43%	\$236,843,869.78	\$102'269,290.00	\$134'574,579.78	
2.2	Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	25%	\$0.00	\$28'487,500.00	\$85'462,500.00	
2.3	Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	20%	\$0.00	\$38'700,600.00	\$154'802,400.00	
TOTAL			\$236'843,869.78	\$169'457,390.00	\$374'839,479.78	

El punto 2.1, la Transferencia de Recursos fué autorizada el 04 de mayo por la Secretaría de Finanzas, por lo que se continua con la regularización de los contratos.

Los puntos 2.2 y 2.3, a la fecha la Secretaría de Finanzas aún no asigna los Recursos para estas acciones.

Personas involucradas (trabajadores, voluntarios, DRO's; como aplique)	Número total de personas beneficiadas
Brigadas 0	0

4.- Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, que si bien no generan un costo, son parte importante para desempeñar los trabajos para el cumplimiento del Programa.

5.- Anexos



Delegación Tláhuac



Antes del sismo.



Después del sismo

02

Delegación Tláhuac



Instalación de tubería 0.30 m de Ø, sobre la calle Sábalo, entre Pez Vela y Océano, Col. del Mar.

ms

Delegación Tláhuac



*Infraestructura de agua potable concluida en la calle de
Camarón entre Aleta y Pez Vela, Col. del Mar.*

Delegación Tláhuac



*Corte de pavimento sobre la calle Laguna de Ensueño,
entre Pirineo y Estanislao Ramírez Ruiz, Col. Selene.*

mf


Delegación Tláhuac



Instalación de tubería y calas de verificación sobre la calle Bodas de Fígaro, esq. Deodato, Col. del Mar.

WJ

Delegación Tláhuac

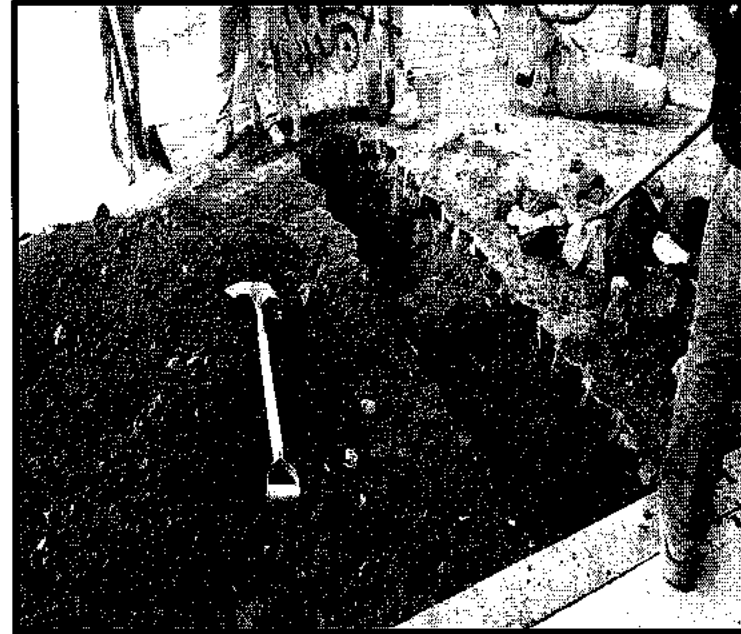

Cala de verificación para detección de infraestructura subterránea sobre la calle Juan de Dios Peza, esq. San Rafael Atlixco, Col. Santa Ana Poniente.

Handwritten signature or mark.

Delegación Tláhuac



Cala de verificación sobre la calle La Turba, esq. Ernani, Col. Metropolitana.

asf
